



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 30./2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια(4) τεσσάρων ξύλινων οικίσκων προοριζόμενα για τέσσερις στάσεις λεωφορείων σε κοινόχρηστους χώρους Ψαχνών, Πολιτικών, Στενής, Τριάδας»

Ενδ. Προϋπολογισμός: 24.000,00 €

CPV 45213315-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την Προμήθεια τεσσάρων ξύλινων οικίσκων προοριζόμενα για 4 (τέσσερις) στάσεις λεωφορείων στις πλατείες κοινότητας Ψαχνών, Πολιτικών, Στενής Τριάδας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Οι στάσεις θα τοποθετηθούν στους κοινόχρηστους χώρους πλατείας παραποτάμιου στα Ψαχνά, εμπροσθεν κτιρίου Κριεζωτίου στην Τριάδα, δίπλα στο περίπτερο Στενής, στην είσοδο των Πολιτικών μετά την γέφυρα.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των **24.000,00 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% στην ανωτέρω προμήθεια περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης, του αναδόχου το οποίο θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2023 στον:

- **Κ.Α. 30-7135.030** με τίτλο «**Προμήθεια οικίσκων για στάσεις λεωφορείων του Δήμου**» ποσού **24.000,00** ευρώ.

Ψαχνά 15/06/2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ
ΤΕ3 με βαθμό Α'

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ
ΤΕ με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 30./2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια (4) τεσσάρων ξύλινων οικίσκων προοριζόμενα για τέσσερις στάσεις λεωφορείων σε κοινόχρηστους χώρους Ψαχνών, Πολιτικών, Στενής, Τριάδας »


Ενδ. Προϋπολογισμός 24.000,00 €

CPV 45213315-4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1,50 x 3,50m

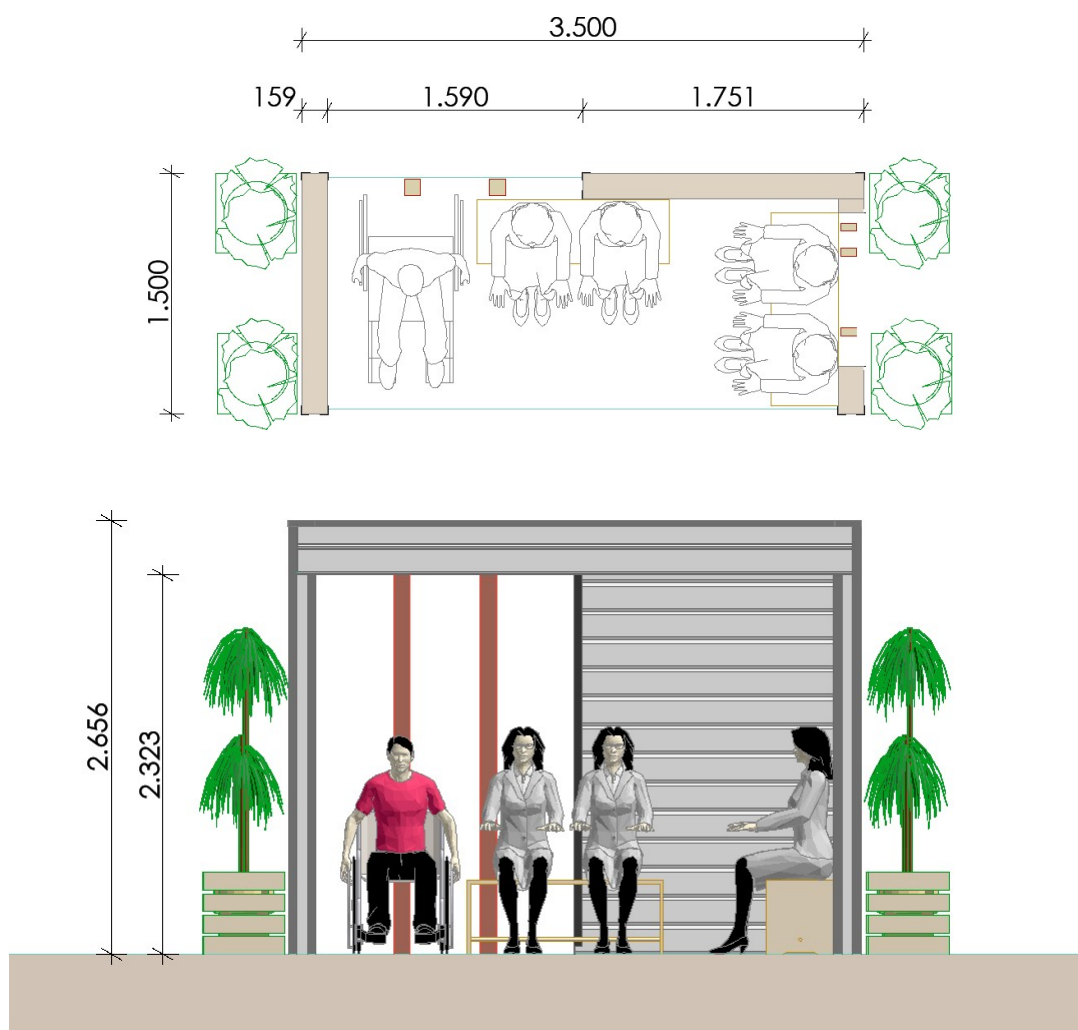



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΟΚΟΙ GL 24 ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ:

- 1 ΔΟΚΑΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ
- 2 ΣΕΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΕΣ

Σύνθετες ξύλινες διατομές εισαγωγής, πιστοποιημένης ξυλείας GL24 που απαιτούνται για την υποστήριξη μεγάλων ανοιγμάτων και προκύπτουν από την στατική μελέτη του κτιρίου.

ΚΟΛΩΝΕΣ 10x10:

- 1 ΚΟΛΩΝΕΣ 11X11 / 3 GL
- 2 ΒΑΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΙΔΑ
- 3 ΟΥΠΑ

Κολώνες ορθογώνιας διατομής. Φέρουν γαλβανισμένη ντίζα ρύθμισης του ύψους.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Μεταλλικά στοιχεία συνδεσμολογίας και πάκτωσης της κατασκευής.

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΤΟΙΧΟΠ W28 ΚΟΡΜ- ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ -ΚΟΡΜΑΚΙ

- 1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ LOG PANEL
- 2 ΠΗΧΑΚΙ 8mm
- 3 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ
- 4 ΞΥΛΕΙΑ 50 X 100 (5X10)
- 5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ LOG PANEL
- 6 ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ ΠΣΤΟΛΙΟΥ
- 7 ΒΙΔΕΣ 6 X 120
- 8 ΓΩΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΚΜΕΣ



ΒΑΦΕΣ

ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

- 1 ΒΑΦΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ / ΤΕΛΙΚΟ
- 3 ΒΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟ

Οι βαφές είναι νερού και διατίθενται σε 2 βασικές αποχρώσεις. Εκρού για τα ξύλα και σκούρο ανθρακί για τις μεταλλικές γωνίες.

Προσοχή, εφόσον το αρχικό ξύλο εκ φύσεως έχει επιφάνεια με διάφορες αποχρώσεις, έτσι και το τελικό βαμμένο ξύλο παρουσιάζει ανάλογη ποικιλοχρωμία.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΣΑ

- ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΙΣΣΑ ΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

- 3 ΛΕΝΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΓΕΡΑΝΟΣ/ΞΕΦΟΡΤΩΜΑΤΑ

Γερανός Παπαγαλάκι με χειριστή και έναν βοηθό.


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- PLEXIGLASS
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΣΤΕΓΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 2% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ

- ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΠΙΕΤΣΩΜΑ 15 ΜΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
- ΚΑΔΡΟΝΑΚΙ ΚΛΙΣΕΩΝ (2% ΠΕΡΙΠΟΥ)
- ΔΟΚΟΙ 80*160 ΒΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΑΒΑΝΙΟΥ ΜΕ ΞΥΛΟ

3 Παγκάκια του ακόλουθου τύπου (ή παρόμοιο) και 4 δενδράκια με περιμετρικά ξύλα προστασίας.

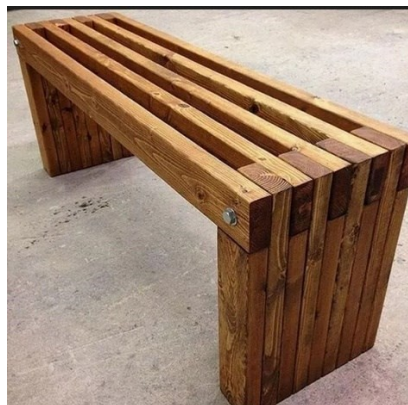

Οι ανωτέρω ξύλινη οικίσκοι πρέπει να πληρούν :

Έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου (ων) FSC-STD-40-004 (Έκδοση 3.1) EN και FSC-STD-50-001 (Έκδοση 2.1) EN για Πιστοποίηση FSC® Chain of Custody

Με Πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης την αγορά σανίδων, δοκών, σανίδων από μασίφ ξύλο FSC 100% και FSC Mix, Ξυλεία και ξυλεία διαστάσεων, φινιρισμένο και FSC 100% Finger συνδεδεμένο ξύλο, Κολλημένη πλαστικοποιημένη ξυλεία (GLULAM), επένδυση τοίχου και FSC Mix Oriented Strand Board (OSB).

Το εμπόριο FSC 100% και FSC Mix Σανίδες, Δοκοί, Σανίδες, Μασίφ ξύλο, Ξυλεία και ξυλεία διαστάσεων, φινιρισμένη και FSC Mix Oriented Strand Board (OSB) και FSC 100% Ξύλο με δάχτυλο, κολλημένη πλαστικοποιημένη ξυλεία (GLULAM), Επένδυση τοίχων, ως ενιαία θέση, κάτω από το σύστημα μεταφοράς.

Η κατασκευή FSC 100% και FSC Mix Dimensional ξυλείας και ξυλείας, τελειωμένα, Επένδυση τοίχων, Σπίτια και δομικά στοιχεία, Περιφράξεις, πασσάλους φράχτη, χλωμά, Καταστρώματα και στρωτήρες κήπου, ως ενιαίο χώρο, κάτω από τη μεταφορά Σύστημα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**Ψαχνά, 15/06/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ
ΤΕ3 με βαθμό Α'**

**ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ
ΤΕ4 με βαθμό Α'**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 30/2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια (4)τεσσάρων ξύλινων οικίσκων προοριζόμενα για τέσσερις στάσεις λεωφορείων κοινόχρηστους χώρους Ψαχνών, Πολιτικών, Στενής, Τριάδας »

Ενδ. Προϋπολογισμός 24.000,00 €

CPV 45213315-4

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα αφορά την Προμήθεια τεσσάρων ξύλινων οικίσκων προοριζόμενα για τέσσερις (4) στάσεις λεωφορείων σε κοινόχρηστους χώρους Ψαχνών, Πολιτικών, Στενής, Τριάδας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 2° : Ισχύουσες διατάξεις

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α 114/2006)
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 ,αρ.38,96 και 118,όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.4605/2019 και Ν.4782/2021 και ισχύουν.
4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου στην σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2023 με:
 - **Κ.Α. 30-7135.030** με τίτλο «**Προμήθεια οικίσκων για στάσεις λεωφορείων του Δήμου**» ποσού **24.000,00** ευρώ.
6. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την ανωτέρω υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 3° : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα αφορά την Προμήθεια (4)τεσσάρων ξύλινων οικίσκων προοριζόμενα για 4 (τέσσερις) στάσεις λεωφορείων στους κοινόχρηστους χώρους Ψαχνών, Πολιτικών, Στενής, Τριάδας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων .

Ψαχνά 15 /06/2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ
ΠΕ3 με βαθμό Α'

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ
ΤΕ4 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 30/2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια 4(τεσσάρων) ξύλινων οικίσκων
προοριζόμενα για 4 στάσεις λεωφορείων
κοινόχρηστους χώρους Ψαχνών, Πολιτικών, Στενής,
Τριάδας»

Ενδ. Προϋπολογισμός 24.000,00 €

CPV 45213315-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1.	Στάση-οικίσκος ξύλινη 1,50x3,50m	4	4.838,71	19.354,84
	Γενικό σύνολο		Μερικό σύνολο	19.354,84
			ΦΠΑ(24%)	4.645,16
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24.000,00

Ψαχνά 15/06/2023

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ
ΠΕ3 με βαθμό Α'

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ
ΤΕ4 με βαθμό Α'

